

Consolidating Key Management Actions in Indio Maiz Biological Reserve, Nicaragua

INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO



Humedales del Sureste de Nicaragua

Elaborado por:

Norving Torres
Director Ejecutivo



Julio 23, 2010



INFORME FINAL DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO

I. DATOS BÁSICOS

Nombre de la Organización: Fundación Amigos del Río San Juan (**FUNDAR**)

Título del Proyecto: Consolidating Key Management Actions in Indio Maiz Biological Reserve, Nicaragua.

Socios Involucrados en la Implementación del Proyecto: URACCAN y ADEPHCA

Colaboradores de apoyo a la gestión del proyecto: MARENA, SERENA y COCBIO

Fechas de Implementación del Proyecto: 1 Junio 2009 – 31 May 2010

Fecha de Informe: 23/07/10

II. COMENTARIOS INICIALES

Incluya cualquier comentario inicial que pueda ayudar en la revisión de este informe.

Con este proyecto se concluye una etapa de intervención que nace hace cinco años con la intervención de CEPF, en Nicaragua, y en este caso en la región del sureste, pasando por tres proyectos que inician en la planificación del manejo de la reserva Biológica Indio Maíz.

La ejecución de este proyecto ha contribuido a que se fijen las bases para la consolidación de las iniciativas de conservación y manejo que se ejecutan en el área protegida Reserva Biológica Indio Maíz y que forman parte de la Reserva de Biosfera Río San Juan – Nicaragua.

Con apoyo de CEPF y CI, se formuló el plan de manejo de la Reserva Biológica Indio Maíz, se implementaron actividades prioritarias indicadas en el plan de manejo aprobado por el ministerio del ambiente y los recursos naturales (MARENA), y en este contexto también se apoyaron las acciones más estratégicas de la gestión de la reserva dirigiendo de esta manera la intervención hacia los componentes más importantes del plan de manejo.

En la etapa de consolidación, que es la que estamos desarrollando, hemos orientado nuestras iniciativas hacia la sostenibilidad en la gestión de la reserva, partiendo de los potenciales en bienes y servicios que posee la reserva, además de la capacidad de uso sostenible de los recursos que se manejan dentro de la misma, a través de un esfuerzo coordinado de conservación entre aliados estratégicos para cumplir eficazmente con los componentes de este proyecto.


III. LOGRO DEL PROPÓSITO DEL PROYECTO

Consolidadas las iniciativas de conservación en la reserva biológica Indio Maíz.

Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
<p>Consolidar las iniciativas de conservación y manejo que se ejecutan en la reserva biológica Indio Maíz, en el marco de alianzas estratégicas entre la sociedad civil, instancias de gobierno local, la cooperación internacional, el estado nacional y la empresa privada que se articulen para garantizar la sostenibilidad financiera para la gestión del área y su zona de amortiguamiento. Implementándose mecanismos e iniciativa de gestión ambiental para el manejo y conservación de las áreas de biodiversidad prioritarias a través de la coordinación interinstitucional y comunitaria. Aplicadas las políticas de salvaguarda y garantizado los objetivos del proyecto.</p> <div data-bbox="375 1041 678 1297" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="423 1297 630 1325">Educación Ambiental</p> <div data-bbox="375 1352 678 1570" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="380 1575 673 1602">Conservación de Biodiversidad</p> <div data-bbox="370 1629 683 1801" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="428 1801 625 1829">Protección y Control</p>	<p>Se consolidan las iniciativas de conservación y manejo que se ejecutan en la Reserva Biológica Indio Maíz, basándose en las alianzas estratégicas que se desarrollan entre la sociedad civil, las instancias de gobierno local, las instituciones, los representantes de organismos internacionales y las empresas privadas ubicadas en el área. Para la gestión de conservación se estructura una propuesta esquema de funcionamiento para la captación de fondos en búsqueda de la sostenibilidad del área. Esta acción del proyecto se complementa con la atención a la formulación de la iniciativa de alianzas público-privadas (PPP), planteada como alternativa de incidencia y participación en la gestión local de conservación. El seguimiento técnico al plan de acción de la gestión productiva del gremio cacaotero, principal fuente de producción local, que son asistidos por empresa certificadora para calificar el cacao y alcanzar niveles de exportación. Los comunitarios organizados en la zona, que representan el recurso humano fundamental para la gestión local de acciones de conservación, se encuentran capacitados y funcionando, de igual manera las organizaciones agrupadas en la COCBIO, recibieron atención a través de las acciones del proyecto para su fortalecimiento. Por parte de FUNDAR, la construcción del Plan Estratégico Institucional permitirá una gestión técnico - administrativa más funcional y sistemático de acuerdo a su visión y misión, en la ejecución de proyectos y programas socio ambiental.</p>

Formulada una propuesta para la creación y esquema de funcionamiento del Fondo, con su cronograma de pasos a seguir para su constitución oficial y puesta en operación.



Está formulada la propuesta de esquema de funcionamiento como mecanismo de captación de fondos, para la conservación de la reserva de Biosfera Río San Juan – Nicaragua. Se encuentra evaluada y se ha definido la elaboración de un estudio de factibilidad a nivel local del fondo, donde los principales actores sean los gobiernos locales (05) y los productores y empresarios ubicados en el área de estudio.

La propuesta es una herramienta diseñada para mover e invertir recursos financieros para la conservación de áreas estratégicas y de alto valor por la concentración de diversos recursos naturales, en especial la abundancia de biodiversidad. Se basa en el concepto de bienes y servicios ambientales y se vincula a los servicios más tangibles para los usuarios.

Analizada la viabilidad de un fondo limitado a territorios y temas, tomando en cuenta experiencias similares en la región de mesoamérica.



El Castillo, sitio turístico de la región

Las oportunidades económicas derivadas de las ofertas de bienes y servicios ecosistémicos que posee la Región del Sureste de Nicaragua, son realmente importantes y podrían significar ingresos reales para los pobladores del área y para el país en general. Particularmente las áreas protegidas; Reserva Natural Cerro Silva, Reserva Biológica Indio-Maíz, Reserva Natural Punta Gorda y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, objeto de este estudio, poseen potenciales ecológicos y económicas de gran relevancia, los que deben ser valorados y aprovechados de manera que estas áreas, ofrezcan opciones de uso a largo plazo, de forma sostenible, para que contribuyan al mantenimiento del sistema territorial y socioeconómica al que pertenecen, la Reserva de biosfera del Sureste de Nicaragua.

	<p>Existen muchas experiencias sobre mecanismos financieros aplicados a diferentes realidades y características territoriales e institucionales en la región y en Latinoamérica.</p> <p>Aquí se han analizado algunas de ellas con el fin de conocerlas y obtener criterios y conocimientos que permitan rescatar aplicaciones al caso de la Reserva del Sureste y sobre todo rescatar algunas lecciones aprendidas que sirvan para el diseño específico de mecanismos aplicables a la realidad territorial e institucional del Sureste de Nicaragua.</p>
<p>Promovidas al menos dos alianzas públicas y privadas con los empresarios, para generar aportes voluntarios para la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz y los sitios de interés ecológico de las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda.</p> 	<p>Con la idea involucrar al sector privado se ha promovido el proceso de formación para la puesta en marcha de un modelo de iniciativa público-privada con empresarios de atención a los rubros de producción de arroz, cítricos y palma.</p> <p>Se concretiza la elaboración y presentación de la propuesta de iniciativa público-privada de cítricos (Frutales del San Juan), como parte de la estrategia de sostenibilidad financiera de la Reserva y sus zonas críticas.</p> <p>El modelo forma parte de la experiencia aplicable a las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda. En el sureste la iniciativa es apoyada por el ministerio de ambiente y recursos naturales (MARENA) y el gobierno local.</p>
<p>Ejecutado un plan de acción que fortalezca la gestión productiva del 50% del gremio cacaotero en Río San Juan, donde participan todos los actores involucrados en esta actividad, CI y FUNDAR.</p>	<p>Uno de los rubros que de manera sostenible se producen en la reserva es el de caco, de ahí que con este proyecto se propuso la formulación y ejecución de el plan de acción para fortalecer la gestión productiva del gremio cacaotero, en la zona de Río San Juan, donde participan MARENA, Proyecto de Manejo Sostenible (PMS), con fondos de Dinamarca, el Proyecto ARAUCARIA -</p>



MARENA, con fondos de AECI-España, IPADE, Instancia de atención técnica a productores con fondos de Austria ASIHERCA.

La organización de grupos de productores de cacao, son atendidos por Biolatina, certificadora del producto y condición que ha sido apoyada por el proyecto.

Para ellos se ha procurado el acompañamiento de la COOPERIO como instancia financiera local que apoya al sector productivo y FUNDAR instancia técnica de apoyo a la comisión de cacaoteros y miembro secretario de la Comisión. Atendidos en el proceso, un total de 110 productores de cacao ubicados en la zona de amortiguamiento.



Formulados tres proyectos y presentados a la cooperación internacional, que permitan ser invertidos en garantizar la sostenibilidad económica de la RBIM y su área de amortiguamiento.

Formulados tres proyectos de iniciativa de conservación y apoyo al desarrollo productivo local sostenible, de acuerdo a los programas aprobados en el Plan de Manejo de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Se fundamentan en la sostenibilidad financiera, que permita que los actores locales asuman responsabilidades y desarrollen acciones de conservación, contando con las iniciativas que anteceden en el territorio del sureste y que forman parte de las experiencias locales. Los proyectos presentados fueron los siguientes:



- Proyecto GEF – RAF 5, en el marco de las iniciativas de conservación y manejo de toda la reserva de biosfera del sureste

	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto del Corredor Biológico de Humedales, presentado en el marco de la iniciativa Gaspar, a UICN. • Proyecto presentado a Unión Europea, iniciativa de fortalecimiento a la producción sostenible en el sureste.
<p>Coordinar de manera efectiva con las cuatro principales agencias de cooperación que intervienen en la reserva biológica Indio Maíz y su zona de amortiguamiento, la gestión de los elementos naturales de conservación presentes en el área.</p>	<p>El proyecto coordina con las Agencias de cooperación se encuentran integradas bajo los planes de acción involucrados en el MARENA, SERENA y COCBIO, las que cuentan con iniciativas de conservación, desde sus funciones y coinciden en la gestión local de participación activa para el desarrollo de acciones socio ambientales en beneficio de las comunidades y la sostenibilidad de las áreas protegidas. Se intercambia información de los planes operativos y gestión de proyectos.</p>
<p>Involucrados los principales líderes de 41 comunidades, de la zona de uso especial, que intervienen en la reserva, en las diferentes acciones de conservación del plan de manejo de la RBIM.</p> 	<p>Se ha consolidado el liderazgo de los principales líderes de la zona de uso especial que intervienen en la reserva, principalmente los que se ubican en la zona de amortiguamiento de la RBIM, (06), a través del entrenamiento en el curso del Diplomado en Gestión y Desarrollo Sostenible y acciones de conservación de la reserva, planificado en conjunto con los socios del proyecto ADEPHCA y URACCAN, con el objetivo de comprender conceptos básicos de la gestión ambiental, conocimiento de las principales herramientas y estrategias para la conservación y restauración de los recursos naturales y el medio ambiente y análisis del marco legal institucional aplicable a la gestión socio ambiental en las áreas protegidas a nivel nacional. La coordinación entre los socios del proyecto, permitió la culminación de aprendizaje de los líderes y su participación en el desarrollo de los IV módulos temáticos del diplomado.</p>
<p>Fortalecida las capacidades institucionales de FUNDAR para en manejo de los programas y proyectos, desde el punto de vista técnico y financiero, que se deriven de los alcances futuros de esta propuesta.</p>	<p>Formulada la planificación estratégica de FUNDAR, basada en el análisis integral de las herramientas de gestión ambiental de la región, diseñada y en ejecución. Se consolidan los resultados de la aplicación del Score Card de CI, aplicable a la fundación,</p>

	<p>con mejoramiento de la capacidad institucional, organizativa y de funcionamiento administrativo fortalecido, que permitirá una gestión técnica y administrativa funcional y sistemática, implementándose los mecanismos de control interno, técnicos y financieros actualizados y consolidados para el mediano y largo plazo.</p>
<p>Fortalecida la plataforma de la COCBIO, con formada por la sociedad civil de la zona de Río San Juan y la RAAS, para la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz, liderada por URACCAN, CI, ADEPHCA y FUNDAR, en coordinación con todos los miembros de la coalición.</p> 	<p>Fortalecida la gestión de la plataforma de actuación de la COCBIO, a través del apoyo a la gestión de la construcción de una plan de acción de incidencia local vinculada a la atención de los principales problemas ambientales producidos por la acción antrópica de la zona y que se enmarcan en las agendas institucionales de MARENA y SERENA. Las acciones dirigidas en el contexto del fortalecimiento de COCBIO, se ejecutan en función de la continuidad de las acciones, por medio de un proceso de consecución de fondos que garanticen la continuidad la conservación y manejo de la reserva.</p>
<p>Fortalecida la sinergia interinstitucional Gobierno Territorial Rama-Kriol, la sociedad Civil, agencias de gobierno, FUNDAR, ADEPHCA, ONG's, medios de comunicación y organismos financiadores) a través de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de acciones para la protección, conservación y sostenibilidad de los sitios identificados como prioritarios de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, coordinado por URACCAN, ADEPHCA y apoyado por FUNDAR.</p>	<p>Para el fortalecimiento de la sinergia interinstitucional como parte de las acciones se implementó el programa de Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto con los comunitarios de la zona de la Reserva y sus áreas críticas, bajo la coordinación de URACCAN y apoyo de FUNDAR. Se ejecuta la estrategia de vigilancia y control por los actores locales y nacionales; SERENA, MARENA, GTR-K, Ejército, Policía, ADEPCHA y las Universidades, implicadas en esta acción estratégica, para contribuir a mitigar las actividades ilícitas en las áreas de biodiversidad prioritarias.</p> <p>Se ha apoyado el programa de biosensibilización ejecutada por URACCAN.</p>

Describa el éxito del proyecto en términos de lograr su meta pretendida de impacto y los indicadores de desempeño.

Con el proyecto se ha avanzado en la consolidación de las iniciativas de conservación de la reserva Biológica Indio Maíz, y su área de influencia, a través de la coordinación interinstitucional y el trabajo de planificación conjunta de los proyectos ejecutados a través de CEPF. Además se ha logrado consensuar y formular una propuesta de sistema de captación de fondos para las acciones de gestión de la reserva una vez que las iniciativas de cooperación internacional hayan dejado su intervención en la zona del sureste de Nicaragua; en este caso la reserva de Biosfera de Río San Juan.

En este contexto dentro del indicador #1, se ha propuesto que para darle seguimiento al sistema de captación de fondos se ha propuesto la realización de un estudio de factibilidad, donde los mecanismos endógenos de generación de recursos económicos se puedan evaluar bajo los intereses de los actores locales que administran los bienes y servicios ambientales del territorio.

¿Hubo algún impacto inesperado (positivo o negativo)?

Dentro de la propuesta se planteó la necesidad de darle seguimiento al gremio de productores de cacao, en este caso era la articulación de todas las cooperativas que producen este rubro en el territorio del sureste; ahí pudimos constatar que es una de las actividades que en este momento mitiga el cambio de uso de suelo, que evita el avance de monocultivos como la palma africana y que provoca la regeneración natural cuando se acompaña de producción de cacao orgánico. De tal manera que con esta actividad (rubro cacao), se ha podido evidenciar que existe una franja de protección de la reserva Biológica Indio Maíz; ubicada entre la zona de uso especial y zona agroforestal, de 45,000 mil ha de bosque naturales con sistemas productivos sostenibles. Las actividades se realizaron en un escenario diferente al de las fases anteriores, en este caso con la retirada de la cooperación Alemana (GTZ), y la cooperación Española (Programa ARAUCARIA), de ahí que los esfuerzos los tuvimos que hacer de manera más coordinada con las iniciativas de gestión local y de cooperación internacional que todavía funcionan en el territorio.

IV. RESULTADOS DEL PROYECTO

Desempeño Planificado versus Desempeño Real

Indicador	Real a la Finalización
Resultado 1: Promovida la sostenibilidad de financiamiento para la Reserva de Biosfera del Sureste, enfocando en la Reserva Indio Maíz y las áreas de interés ecológico de las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda	
<p>1.1 Estructurado un fondo patrimonial o fondo de fideicomiso para proyectar la obtención de recursos financieros que permitan la implementación de acciones de conservación, con el aporte de sector privado, cooperación externa, y el estado que apoyando a las organizaciones con políticas de conservación, con el fin de promover la sostenibilidad financiera de la Reserva Biológica Indio Maíz y las áreas de interés ecológico de las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda.</p> 	<p>La gestión de conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz, es una iniciativa desde 2004 apoyada por CEPF y CI, con la ejecución del Plan de Manejo del área protegida, en este contexto, se definen las líneas de acción, se proponen los programa y proyectos y se definen las normativas de aplicación, de acuerdo a zonificación e importancia biológica.</p> <p>En el año 2007 se ejecuta con CEPF y CI, el proyecto “<i>Ejecución de actividades prioritarias del plan de manejo de la RBIM</i>” que pone en marcha iniciativas de conservación importantes para el desarrollo socio ambiental de los actores locales, articulando y vinculando la gestión a los niveles interinstitucionales.</p> <p>En la etapa actual de gestión y ejecución, se cuenta con un panorama de una coordinación establecida, una gestión que necesita la consolidación, por lo que la propuesta de un fondo patrimonial o fondo de fideicomiso, reúne las acciones anteriores y propone mecanismos para concretizar la obtención de fondos financieros para la sostenibilidad de las áreas protegidas del sureste de Nicaragua.</p> <p>Con el conocimiento de los antecedentes de la gestión, la propuesta se basa en el manejo y aprovechamiento de diferentes bienes y servicios ambientales: Oferta Hídrica, Belleza Escénica, Elementos de biodiversidad, Fijación de CO₂ o producción de oxígeno, del bosque productos y sub-productos forestales (no maderables), Recreación, Ecoturismo, Conservación de suelos, Mitigación de desastres entre otros elementos identificados.</p>

1.2

Estructurada y ejecutada la incidencia en la aplicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático para promover las iniciativas de proyectos REDD en la zona de influencia de la Reserva Biológica Indio Maíz, y zonas de interés ecológico de las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda



Con la intención de generar un espacio que facilite el intercambio de información, el debate, hasta la reflexión y la generación de aportes hacia las propuestas oficiales en el transcurso de este proceso, se apoyó la organización de los primeros conversatorios para dar a conocer la estrategia en la zona con miras a definir un plan de trabajo conjunto respecto al clima.

Se elaboró la propuesta de plan de acción para la implementación de la estrategia de cambio climático en la región del sureste, y principalmente en las zonas de interés de la reserva biológica Indio Maíz y las zonas de influencia de Cerro Silva y Punta Gorda.

Elaborada la propuesta de mecanismos REDD, para la validación ante la mesa de trabajo de las iniciativas de Cambio Climático en el seno de la sociedad civil. Se ha retomado la discusión en base a la nueva postura de Nicaragua, ante la COP 16, donde se proyecta la incorporación para la consecución de fondos para proyectos REDD.

1.3

Promovidas un sistema de alianzas públicas y privadas con los empresarios, para generar aportes económicos voluntarios para la conservación de la reserva Biológica Indio Maíz y los sitios de interés ecológico de las reservas naturales Cerro Silva y Punta Gorda.



Se plantea el modelo de iniciativa público-privada con empresarios de atención a los rubros de producción de **arroz, cítricos y palma**. Siendo el rubro de **cítricos con la empresa privada (Frutales del San Juan)**, la iniciativa en proceso de búsqueda de fondos para su implementación.

Realizada sesión con actores locales y empresa privada para el desarrollo de iniciativas públicas y privadas (PPP), que permitan el aporte de fondos para desarrollo de proyectos de conservación en el marco de la RBIM, en este caso se ha invitado a la empresa Cítrico del san Juan, MADENICAS (MADERAS de Nicaragua), Arroceras de Río San Juan, COOPERRIO, CANTUR y las Cooperativas de Cacao.

A la iniciativa se ha sumado la participación de empresas nacionales y extranjeras que podrían interesarse en tener una mayor proyección de cara a la responsabilidad ambiental y que les permita beneficiar sus proyectos y la conservación de la Reserva.

	<p>Estos acuerdos parten de la perspectiva de tener una responsabilidad empresarial ambiental, de lo que se derivan una serie de acciones que podrían mitigar los impactos en los que incurren determinadas empresas en el territorio y que puedan beneficiar a la conservación y desarrollo sostenible de las comunidades que en esos territorios sobreviven.</p>
<p>1.4 Apoyar el funcionamiento de los mecanismos financieros económicos existentes y establecidos por la ley, en el país, como medio de apoyo para permitir la sostenibilidad financiera de la reserva de biosfera de Río San Juan.</p>	<p>Se han definido los conceptos técnicos para desarrollar una propuesta de sello de origen para la Reserva de Biosfera de Río San Juan, para definir la propuesta que se adapte con mejor condición, a la dinámica de este tipo de mercado, y que tenga una buena aceptación en el plano, nacional e internacional; la proyección es promocionar y vender productos que salen de la Reserva, esto como parte de las potencialidades que tiene la misma, y para que lo que se comercializa tenga valor agregado, en virtud de los precios y condiciones actuales del mercado.</p> <p>Presentado sello de origen por la autoridad correspondiente que certifica el origen de la producción de la Reserva de Biosfera de Río San Juan y cosechado principalmente en las zonas críticas de la Reserva Biológica Indio Maíz.</p>
<p>1.5 Formulados y gestionados tres proyectos fundamentados en sostenibilidad financiera para la conservación de las áreas protegidas por parte de los Miembros de la Comisión de proyectos del Gobierno Territorial Rama - Krioll (GTR-K), Comisión de apoyo a la gestión y Comisión de coordinación de las áreas protegidas, de manera participativa, formulan y gestionan.</p> 	<p>Se han formulado los proyectos fundamentados en sostenibilidad financiera para la conservación de las áreas protegidas; se está a la espera de respuesta de la convocatoria que se aplicó.</p> <p>La perspectiva de los proyectos se orienta hacia la participación de actores con incidencia local con grupos organizados de perfil ambientalista de la zona de amortiguamiento de la RBIM.</p> <p>En este contexto se han presentado propuesta a la Unión Europea, fondos del GEF – RAF 5 y a la UICN.</p>

<p>1.6 Ejecutado un plan de acción que fortalezca la gestión productiva del gremio cacaotero, en la zona de Río San Juan, donde participan MARENA, Proyecto de Manejo Sostenible (PMS), Proyecto ARAUCARIA - MARENA, Pueblos en Acción Comunitaria (PAC) y FUNDAR.</p>	<p> Junto con la comisión territorial de producción de cacao de Río San Juan, se coordinó la ejecución de taller de planificación de dicha comisión, para promover los mecanismos y medios de articulación de la producción del cacao y su desarrollo amigable con el entorno en las zonas de conservación de la biosfera; se incluye en los mecanismos de coordinación la participación de los socios del proyecto URACCAN como parte de las experiencias compartidas.</p> <p>El resultado final, ha sido que la formulación y ejecución del plan de acción que fortalece la gestión productiva del gremio cacaotero, en la zona de Río San Juan, donde participan el ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA con el Proyecto de Manejo Sostenible (PMS), Proyecto ARAUCARIA - MARENA, IPADE, ASIHERCA, COOPERIO y FUNDAR</p>
<p>1.7 Fortalecidas la red de agencias de cooperación existente en la región (SERENA, MARENA, COCBIO) para contribuir a las iniciativas de conservación y manejo que se formulen y ejecuten en función de la sostenibilidad de las áreas protegidas.</p>	<p>Como consecuencia del trabajo de la comisión de la reserva de biosfera se sigue apoyando la gestión, de la misma, de cara al trabajo coordinado con los actores claves de la Reserva, quienes construyen iniciativas de conservación y manejo para la gestión de fondos, bajo los programas de los planes de manejo de las Reservas. La perspectiva de "Establecer mecanismos que aseguren la conservación efectiva, de las áreas protegidas y la implementación de alternativas económicas de acuerdo a las necesidades de la población local, a fin de tener un modelo de desarrollo sustentable que garantice la calidad de vida de la poblaciones asentadas en la Reserva de Biosfera del Sureste".</p> <p>Las agencias de cooperación se encuentran integradas bajo los planes de acción involucrados en el MAREBA, SERENA y COCBIO, las cuales se han fortalecido bajo las iniciativas de conservación y manejo que se formulen y ejecuten en función de la sostenibilidad de las áreas protegidas.</p>

<p>Resultado 2: Mejorada y ampliada la coordinación entre todas las municipalidades, agencias de cooperación como Cooperación Danesa (DANIDA), Agencia Española de Cooperación (AECI), Cooperación Alemana (GTZ), y sociedad civil para el manejo integral de la Reserva Biológica Indio Maíz.</p>	
<p>2.1 Diseñado y en ejecución un plan de seguimiento trimestral de las actividades de conservación y manejo que se ejecutan en la reserva, para verificar el desempeño de los programas prioritarios del plan de manejo, verificados bajo los acuerdos de la comisión de coordinación y gestión de la RBIM.</p>	<p>Con esta iniciativa se ha formulado la ficha del plan de las acciones que se ejecutan en la RBIM, donde se verifican las principales acciones de conservación y manejo de la reserva, en el marco de las iniciativas principales que se desarrollan en el territorio.</p> <p>Un valor agregado del proyecto fue que se incorporaron las acciones del plan de desarrollo del GTR-K referidas al plan de manejo de la RBIM, (capacitación, denuncias, gestión ambiental), apoyo para su ejecución incluyéndolos en las acciones aprobadas para el proyecto. Se ha finalizado el proceso de titulación, fase importante para que los miembros del GTR-K se incorporen a las acciones de conservación con mayor seguridad y conocimiento de las líneas del plan de manejo de la RBIM, y Cerro Silva y Punta Gorda.</p>
<p>2.2 Involucrados seis de los principales líderes de la zona de uso especial que intervienen en la reserva, en las diferentes acciones de conservación del plan de manejo, para promover la participación efectiva de las comunidades, a través de sus líderes, para fortalecer el empoderamiento de la sociedad civil en la dinámica de gestión de la RBIM.</p>	<p>En este aspecto se inició con la identificación de los seis líderes comunitarios de la zona especial para participar en el proceso de sensibilización e intercambio de experiencias de acciones de conservación identificadas en el plan de manejo de la Reserva Biológica Indio Maíz especialmente y que interactúan en la Reserva de Biosfera RSJ. Los líderes desarrollan actividades del plan ambiental del municipio de El Castillo, Río San Juan.</p> <p>Además se ha iniciado la consolidación del liderazgo de estos comunitarios (líderes), de la zona de uso especial que intervienen en la reserva, principalmente los que se ubican en la zona de amortiguamiento de la RBIM, a través de la continuidad del entrenamiento en el curso del Diplomado en Gestión y Desarrollo Sostenible y acciones de conservación de la reserva, dirigido por URACCAN.</p>
	

2.3

Documentadas y divulgadas las acciones de conservación, a través de un boletín electrónico trimestral que circulará por Eco-index y el Sistema de Información Ambiental (SINIA), generado por medio de la información de los actores de la comisión de coordinación y gestión de la RBIM.

Gobierno de Nicaragua estimulando el desarrollo científico ambiental Premia a ejemplar organismo

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Biodiversidad, el Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) otorgó un reconocimiento al organismo de la sociedad civil Fundación Amigos del Río San Juan, por sus logros (FUNDAR), quien dedica gran parte de su labor a esfuerzos de conservación a través de la Investigación Científica de la Biodiversidad en áreas protegidas de Nicaragua. Esta vez el Gobierno reconoció al esfuerzo por el gran valor científico que aportan a la ecología en territorio del Río San Juan.

"Es un premio que otorga el Gobierno por nuestro trabajo, pero debemos agradecer al resto de organizaciones y entidades, tanto del Gobierno como Alcaldías que trabajan con nosotros en alianza, para proteger esta zona, rica en Recursos Naturales", Edgardo Novoa Torres, director ejecutivo de FUNDAR.

Cabe señalar que El Gobierno Nicaragüense a través del MARENA, promueve la relación justa y equilibrada entre el hombre y la naturaleza para desarrollar un proceso de Separación de la pobreza y conservación del patrimonio natural y cultural del país, respetando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.



Oscar Irán Amílcar Pérez, muestra el reconocimiento otorgado por autoridades de Gobierno a través del MARENA.

Por medio de los diferentes actores del territorio y este proyecto se ha comenzado a recopilar toda la información para un publirreportaje definido para cubrir el evento de intercambio intersectorial de experiencias de conservación en el territorio de incidencia del proyecto. Ya se ha identificado de acuerdo a TDR de la acción, el medio escrito y el reportero que estará preparando el publirreportaje. Entre las acciones a divulgar se encuentran las actividades que se ejecutarán con COCBIO.

Divulgado el material de sistematización de las acciones del proyecto, incluye ubicación en link de la web de URACCAN - FUNDAR y enviar información en ficha de registro de Eco-index; información generada por medio de la información de los actores de la comisión de coordinación y gestión de la RBIM.

Resultado 3: Fortalecida las capacidades de FUNDAR para en manejo de proyectos, desde el punto de vista técnico y financiero.

3.1

Elaborada la Planificación estratégica de FUNDAR, basada en el análisis integral de las herramientas de gestión ambiental de la región, diseñada y en ejecución.




Se ha fortalecido las capacidades de la organización con la elaboración de la planificación estratégica de FUNDAR y consolidados los resultados del Score Card aplicado a la fundación, se han aplicado los mecanismos de control interno técnico y administrativos y la definición de una metodología para el seguimiento y monitoreo de las acciones del proyecto ejecutadas en el período. En este proceso de fortalecimiento institucional se involucra la junta directiva de FUNDAR.

A esta fecha se ha terminado de formular la planificación estratégica de FUNDAR, basada en el análisis integral de las herramientas de gestión ambiental de la región y los mecanismos administrativos vigentes para el control interno administrativo financiero.

<p>3.2</p> <p>Consolidados los resultados obtenidos de la aplicación del score card de CI a FUNDAR, con el fin de mejorar la capacidad institucional de la organización de manera sistemática.</p>	<p>Como parte de la consolidación de los resultados obtenidos de la aplicación del score card de CI a FUNDAR, se ha realizado por 2da vez esta calificación; en este caso se han visto avances sustanciales en la gerencia, gestión y administración de FUNDAR.</p> <p>Además ya se han revisados los manuales administrativos y listos para ser presentados a la Junta Directiva.</p> <p>Al el cierre del proyecto ha sido reevaluado el resultado obtenido de la aplicación del Score Card de CI a FUNDAR, con el fin de mejorar la capacidad institucional de la organización de manera sistemática.</p>
<p>3.3</p> <p>Implementados por parte de FUNDAR los mecanismos de control interno, técnicos y financieros, actualizados y consolidados, para reforzar las acciones institucionales, en el mediano y largo plazo.</p> 	<p>En principio se han elaborado los términos para implementar los mecanismos de control interno, técnicos y financieros de FUNDAR, que permitan reforzar las acciones institucionales financieras, en el mediano y largo plazo, comenzando con una lista de medidas básicas de manejo de fondos que es desde donde ha partido la ejecución del presupuesto de este proyecto.</p> <p>Uno de los aspectos que sobresale en este contexto de fortalecimiento institucional es la modernización del Sistema Contable para agilizar la información financiera que permita compatibilizar las medidas básicas de control interno con la ejecución del proyecto; ha sido entrenado y preparado el personal contable para una ejecución presupuestaria efectiva y con buenos recursos humanos que administren el sistema.</p> <p>También se preparó la auditoria con corte al trimestre actual de los gastos y procedimientos pertinentes de cara a garantizar los controles interno y la ejecución del proyecto.</p> <p>Las sesiones de trabajo con las sedes operativas de FUNDAR, han iniciado y se ha puesto en práctica las normas técnicas de control interno, ajustadas al procedimiento aprobado en los manuales administrativos.</p>

3.4 Diseñado y ejecutado por parte del comité de dirección del proyecto el sistema de monitoreo y evaluación que determina el nivel de desempeño y el cumplimiento de políticas de salvaguardas, que ha preparado URACCAN y en el que FUNDAR participará.

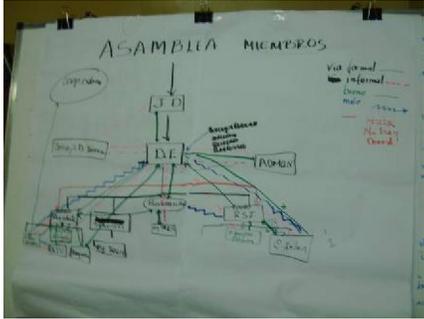

En este caso se cuenta con el acuerdo de vigilar el desempeño de los proyectos y cumplir con las políticas de salvaguarda para la ejecución de los proyectos.

Cada trimestre se ha estado aplicando el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto que determina el nivel de desempeño y el cumplimiento de políticas de salvaguardas, que ha preparado URACCAN y en el que FUNDAR participa.

3.5 Revisados y aprobados por parte del Comité de Dirección del Proyecto, ejecutado por FUNDAR, los informes narrativos y financieros elaborados por el Coordinador y por el contador.



Entregado y aprobado por parte del Comité de Dirección del Proyecto, ejecutado por FUNDAR, los informes narrativos y financieros que elabora el Coordinador y el Contador.

Los informes eran revisados en base a la ejecución presupuestaria y las actividades o tareas que se planificaban y que tenían los productos comprometidos a presentar como parte del seguimiento al desempeño.

Resultado 4: Fortalecimiento de la alianza de la sociedad civil trabajando en pro de la conservación de la Reserva Biológica Indio Maíz y las zonas de interés ecológico de las Reservas Naturales Cerro Silva y Punta Gorda, a través de COCBIO, para facilitar la cooperación e incidencia en temas ambientales.

4.1 Consensuada la solución al menos tres de los principales problemas ambientales inducidos por la acción antrópica y ligadas al avance de la frontera agrícola, que impactan la conservación de la reserva, por medio de la COCBIO, que permitan fortalecer el desempeño de la sociedad

En primera instancia se comenzó a trabajar en la valuación del funcionamiento de la COCBIO, y se documentaron, mediante una ficha oficial, los resultados de cada una de las iniciativas que están ejecutando cada uno de los miembros de la COCBIO, en lo referido a la conservación de la reserva de biosfera.

civil en el accionar de la gestión ambiental de la RBIM.




Miembros de la Comisión de Producción

Bajo este esquema se apoyo la incidencia ambiental bajo las actividades planificadas en el seno de la COCBIO, y que incidieron en los principales problemas ambientales producidos por la acción antrópica de la zona, y que también están enmarcadas, en la agenda del MARENA y la SERENA, a través de la ejecución de sus POAS.

FUNDAR, como miembro de la Coalición, ha estado apoyando las iniciativas de Protección y Control, la Comisión de Producción y la Estrategia de Educación Ambiental; estos tres elementos se traducen en la base para fortalecer la gestión ambiental del territorio y atacar los problemas ambientales que se manifiestan en la zona.

4.2

Refrendadas al menos dos leyes importantes (ley general del medio ambiente y el reglamento de áreas protegidas), que rigen la gestión de los elementos naturales de conservación, por medio de la incidencia de la sociedad civil (COCBIO), para aplicar medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas prioritarios de la región.

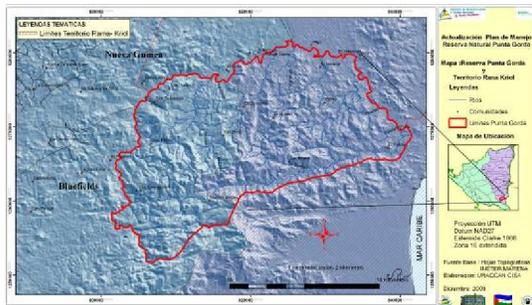

Está organizado el esquema de divulgación de las acciones de gestión y conservación de la sociedad civil, por medio de la prensa, mediante el uso del marco legal vigente, para defender las iniciativas de conservación, este trabajo ha tenido el apoyo de la Red de Comunicadores Ambientales Nacionales.


Los planes de manejo de las Reservas Naturales de Cerro Silva y Punta Gorda, ya fueron dictaminados de manera favorable en el año 2010, gracias al apoyo de todos los actores involucrados y el seguimiento técnico de UARACCAN, ADEPHACA y FUNDAR, en este contexto se puede afirmar que el manejo de ambas reservas va estar con sus respectivos instrumentos legales aprobados.

Han sido titulados a favor de los gobiernos territoriales RAMA – Kriol de la zona del sureste, las áreas naturales que estos pueblos reclamaron desde que se aprobó la ley de autonomía de las regiones autónomas de Nicaragua; estos territorios comprenden más

	<p>de 400,000 ha, que ahora tienen un estatus legal que permite la conservación y manejo sostenible de la región y disminuye las posibilidades de invasiones de tierras indígenas</p>
<p>4.3 Formulado y ejecutado un plan de acción de COCBIO, para la toma de acuerdos y resoluciones de la sociedad civil, para las gestiones de conservación y manejo de la Reserva Biológica Indio Maíz y su zona de amortiguamiento.</p> <div data-bbox="284 688 747 772" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="289 793 756 1144" style="text-align: center;">  </div>	<p>Inicialmente, comenzamos con la actualización y articulación del POA de todos los actores locales, para promover la continuidad efectiva de los planes de conservación de la reserva de biosfera de Río San Juan, y para provocar más alianzas entre los actores de la RAAS y Río San Juan.</p> <p>Se concluye con la formulación del plan de acción, de COCBIO, desde el proceso de convocatoria de la asamblea ordinaria de miembros de la coalición, para garantizar la continuidad de las acciones, por medio de un proceso de consecución de fondos que garanticen la conservación y manejo de la reserva.</p> <p>Hemos proyectado preparar la propuesta de proyecto ante la UE, de parte de la COCBIO, para garantizar la sostenibilidad de la Reserva, en este caso cuando haya una nueva apertura de la convocatoria Nacional de los países Europeos.</p> <p>Hacia el futuro se está considerando el fortalecimiento de la organización, con la construcción de su Planeación Estratégica.</p>
<p>Resultado 5: Implementadas y consolidadas las iniciativas para la protección, conservación y el uso sostenible de la Reserva del Sureste de Nicaragua a través del fortalecimiento y la bio-sensibilización de los comunitarios</p>	
<p>5.1 Apoyo en el fortalecimiento de las capacidades de líderes Ramas, Kriols y Mestizos por medio de su participación en programa de formación en gestión ambiental, aspectos técnicos y legales y al menos en dos intercambios que les permita realizar gestión efectiva y eficiente de las áreas protegidas, aspectos considerados en el Plan de Desarrollo del Territorio Rama-Kriol, Plan de Acción elaborado con fondos de CEPF y Planes de Manejo, coordinado por URACCAN,</p>	<p>En coordinación con URACCAN y ADEPHCA se desarrollaron III encuentros del Programa en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto con la participación de seis líderes, de la zona de amortiguamiento de la RBIM.</p> <p>Con los participante del Programa de Formación en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto, se ha elaborado un plan operativo por comunidad para contribuir</p>

<p>ADEPHCA y apoyado por FUNDAR mediante la participación de al menos seis líderes de la zona de uso especial de la RBIM.</p> 	<p>a mitigar la degradación de los ecosistemas y biodiversidad prioritarios de las Reservas de Cerro Silva, Punta Gorda y la parte norte de Indio-Maíz</p> <p>Se implementaron y consolidaron las acciones de fortalecimiento de capacidades a los líderes comunitarios, con el programa de formación en gestión ambiental, articulando con la estrategia de vigilancia y control que ejercen las instituciones rectoras, en este caso MAREA, SERENA y autoridades locales; este es el primer esfuerzo de esta naturaleza en la región.</p>
<p>5.2 Fortalecidas y reorientada las nuevas fases de gestión de los guardabosques en pro de la protección y conservación de las áreas protegidas mediante la sistematización y análisis de su funcionalidad realizada en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), la Secretaría de los Recursos Naturales (SERENA) y el Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K), coordinado por URACCAN, ADEPHCA y apoyado por FUNDAR.</p> 	<p>Este trabajo inició con la convocatoria a la reunión con la participación de los guardabosques y MARENA, SERENA y el GTR-K para la evaluación de la funcionalidad de los guardabosques y reorientar las nuevas fases de gestión y acciones que se preparan durante el proyecto.</p> <p>Para ello se utilizó un documento mártir, que evidencia la situación de los guardabosques, el cual se ha discutido, analizado y mejorado para trabajar la estrategia de protección.</p> <p>Finalmente, se ha elaborado la estrategia y ahora está en ejecución, y se lleva a cabo por los actores locales y nacionales; SERENA, MARENA, GTR-K, Ejército, Policía, ADEPHCA y las Universidades, implicadas en esta acción estratégica, para contribuir a mitigar las actividades ilícitas en las áreas de biodiversidad prioritarias.</p> <p>Se realiza coordinación interinstitucional basada en la ejecución de los planes operativos.</p>
<p>5.3 Comunitarios Ramas, Kriols y Mestizos se capacitan como promotores para la ejecución del programa de bio-sensibilización fundamentado en la conservación y manejo de los recursos</p>	<p>Inicialmente se comenzó con la formulación del programa de biosensibilización y las acciones de comunicación y divulgación del proyecto, en este tema específico.</p>

<p>naturales y la biodiversidad en función de generar un efecto multiplicador para la sensibilización de los comunitarios y la población en general sobre la importancia de la protección y conservación de los sitios identificados como prioritarios en la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, coordinado por URACCAN, ADEPHCA y apoyado por FUNDAR mediante la revisión del programa de bio - sensibilización y la participación de los principales líderes de la zona de uso especial de la RBIM participación de los principales líderes de la zona de uso especial de la RBIM</p>	<p>Estas actividades forman parte de la planificación conjunta de los socios del proyecto, URACCAN, ADEPHCA y FUNDAR.</p> <p>Se concluye con todo el proceso de biosensibilización ejecutado por URACCAN, y apoyado por FUNDAR, en el marco del proyecto de CEPF; el programa ha sido certificado por la URACCAN, como universidad, para su ejecución o implementación.</p> <p>En este caso se está llevando a cabo el segundo módulo y cuenta con la participación de la mayoría de los líderes de la región del sureste; la idea es que este programa se concluya con la participación de los asistentes en el curso módulo.</p> <div data-bbox="954 907 1269 1247" data-label="Image"> <p>The image shows the cover of a manual titled 'Manual Guía para la formación de Promotores Ambientales Comunitarios Bluefields, RAAS 2009'. The cover features a colorful illustration of two women in a natural setting, one holding a plant. The text on the cover includes 'PROGRAMA DE BIO-SENSIBILIZACION' and 'Manual Guía para la formación de Promotores Ambientales Comunitarios Bluefields, RAAS 2009'.</p> </div>
<p>5.4 Fortalecida la sinergia interinstitucional Gobierno Territorial Rama-Kriol, la sociedad Civil, agencias de gobierno, FUNDAR, ADEPHCA, ONG's, medios de comunicación y organismos financiadores) a través de la planificación, implementación, monitoreo y evaluación de acciones para la protección, conservación y sostenibilidad de los sitios identificados como prioritarios de la Reserva de Biosfera del Sureste de Nicaragua, coordinado por URACCAN, ADEPHCA y apoyado por FUNDAR.</p>	<p>FUNDAR apoya con las acciones del programa de comunicación bajo la coordinación de URACCAN; y a través de SERENA, MARENA, GTR-K y líderes mestizos, sobre la importancia y conservación de las áreas protegidas.</p> <p>El programa de comunicación (programas radiales, televisivo, boletines, afiches, pagina web) también se ha coordinado con los líderes mestizos, para que ellos también transmitan el mensaje de la importancia que tiene conservar las áreas protegidas; dicho programa se ha ejecutado directamente por URACCAN - ADEPHCA.</p>



Describe el éxito del proyecto en términos de entregar los resultados pretendidos.

Considerando los procesos que apoyó el proyecto, el factor tiempo fue importante considerarlo, principalmente porque cada institución responde a un plan de acción que orienta su labor en el territorio, sin embargo, como estrategia, la inserción de las actividades en sus diferentes planes, permitió avanzar y estar siempre en comunicación y conocimiento de las limitaciones que se avizoraban para dar respuesta a cualquier cambio que se pudiera proyectar en el futuro. Hemos completado la mayoría de las acciones que se han propuesto.

¿Hubo algún resultado no logrado? De ser así, ¿cómo ha afectado esto al impacto general del proyecto?

En la ejecución de actividades del primer, tuvimos solamente el mes de junio para proyectar el trabajo del proyecto. En este caso nuestros socios (URACCAN), que llevaban el componente cinco, de la propuesta no pudieron iniciar las actividades en el mes de junio, de ahí que ninguna de la actividad programadas de desarrolló para nuestro período, de tal manera que lo que tuvo que ver con la implementación y la consolidación de la acciones de protección y conservación de la reserva de biosfera por medio del trabajo de sensibilización a los comunitarios, quedó programado para el trimestre de julio a septiembre.

Resta conseguir el aval de la propuesta del mecanismo de captación de fondos por parte de los actores locales, en este caso dependerá contar también con la aprobación de entidades nacionales que avalan estas iniciativas y el apoyo de algunos socios que puedan favorecer al trámite de la propuesta del fondo, para así obtener la debida certificación y con ello la puesta en marcha del mismo. Es un trabajo que deberá ser impulsado desde diferentes niveles. De tal manera que para la siguiente fase, también se espera consolidar la propuesta de sostenibilidad, en base al estudio de factibilidad del mecanismo de captación de fondos para la reserva.

V. EVALUACIONES DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD

La reserva biológica Indio Maíz, sigue conservándose gracias al trabajo conjunto de las autoridades locales, nacionales y regionales, por medio del acompañamiento del proyecto; en este caso se ha detenido las alarmas de incendios forestales, la cacería y extracción de recursos forestales está bastante controlada; así como la detención de las invasiones de tierra hacia dentro de la Reserva. Todo esto ha funcionado gracias a la articulación de un plan conjunto de actores involucrados en este tema; a pesar de la carencia de recursos los esfuerzos han sido efectivos para esta zona de gran importancia mundial para la conservación de la biodiversidad. Acá el proyecto CEPF, ha sido estratégico para mantener la conservación de la reserva de una manera estable.

VI. LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO

Acompañamiento interinstitucional: Que aunque los recursos en ocasiones son limitados, el acompañamiento de la gestión conjunta permite que algunos obstáculos se puedan superar y hacer las cosas que se tienen proyectadas, independientemente de que tengamos algunas limitaciones financieras; los socios y las alianzas son las que apoyan la superación de este tipo de dificultades.

Alianzas Estratégicas: Debe de existir apertura en la relación conjunta de las alianzas estratégica, ya que esta condición ha permitido que la ejecución de nuestros proyectos no se vean afectados por la falta de integración de la alianza que tenemos con nuestras iniciativas, de tal manera que superamos obstáculos, como por ejemplo, cuando algunos grupos metas condicionan acciones que son estratégicas para el proyecto.

Producción Sostenible: La consolidación del gremio cacaoteros, es un elemento clave de actuación en el territorio, y la implementación de acciones que a través de este gremio pueden ejecutarse, contando con su organización y presencia.

Fortalecimiento de la Sociedad Civil: En relación a la COCBIO, donde participamos los actores de la sociedad civil, se ha tomado como acuerdo plantear las nuevas acciones estratégicas de cara al futuro y tener como perspectiva la posibilidad de ser parte de un fondo de fideicomiso donde los actores presentes en la coalición sean ejecutores de las iniciativas que correspondan, de acuerdo al perfil particular.

Integración de Pueblos Indígenas: Se ha avanzado en la presentación de las diferentes etapas de este proyecto con los miembros del GTR - K, ya que hay un interés particular por los diferentes componentes que se ejecutan con los fondos CEPF, que en el caso de la RAAS, están relacionados con los beneficios de los pueblos indígenas y los mestizos de la zona.

Ejecución del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o fracaso).

La lección más importante es que la base del éxito de los proyectos pasa por las condiciones previas a la formulación y en este caso nuestro éxito se ha visto proyectado por la existencia del plan de manejo de la reserva biológica indio maíz, que fue consensuado previamente y que de ahí se desprende las acciones ejecutadas en el actual proyecto.

Ha resultado como lección aprendida, el hecho de que a través del empoderamiento de los actores involucrados en la conservación de la reserva, las capacidades de reacción ante situaciones de amenazas al patrimonio natural, éstas han podido ser controladas y mitigadas, por la coordinación interinstitucional que ahora existe en los diferentes municipios que ahora hacen parte del área protegida.

VII. FINANCIAMIENTO ADICIONAL

Proveer detalles de donantes adicionales que apoyaron este proyecto y de financiamiento recibido como resultado de la donación de CEPF o el éxito del proyecto.

Donante	Tipo de Financiamiento*	Cantidad en USD	Comentarios
IPADE	C	\$7,000.00	Formulación de la Estrategia Forestal del Municipio del Castillo
GTZ	C	\$15,000.00	Diagnóstico del Estado de la Cobertura Natural y Antrópica del Sureste
DANIDA	B	\$45,000.00	Ejecución de la Estrategia de Vigilancia y Control del Sureste.
ARAUCARIA	C	\$65,000.00	Programa de Producción Sostenible en la Zona de Uso Especial de la RBIM
AID	B	\$25,000.000	Estado de Conservación del Caimán en la Costa Caribe de Nicaragua y Río San Juan
UICN	C	\$55,000.00	Consorcio Gaspar del Corredor de Humedales
IPADE	B	\$60,000.00	Programa de Producción Sostenible y Conservación de Bosques en la Zona de Uso Especial de la RBIM
Total		US\$272,000.00	

**Financiamiento adicional debe reportarse según las siguientes categorías:*

- A Co-financiamiento de proyecto (Otros donantes contribuyan directamente a los gastos del proyecto con CEPF).*
- B Financiamiento complementario (Otros donantes contribuyan a organizaciones y agencias socias quienes están implementando un proyecto relacionado con este proyecto con CEPF).*
- C Apalancamiento de la Organización o Socios (Otros donantes contribuyan a su organización o una organización socia como resultado directo de éxitos de este proyecto con CEPF).*
- D Apalancamiento Regional (Otros donantes inviertan grandes cifras en una región debido a la inversión de CEPF o éxitos relacionados a este proyecto con CEPF).*

VIII. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES ADICIONALES

Para la siguiente fase se espera consolidar la propuesta de sostenibilidad, en base al estudio de factibilidad del fondo de compensación.

También estaremos en la línea de fortalecer al gremio cacaotero mediante el fortalecimiento de sus alianzas y apoyo a su sistema de certificación.

Con respecto a la sociedad civil, hemos reactivado la coalición y en este momento estamos implementando el plan de acción, previo elaboración del mismo.

También estamos proponiendo evaluar el estado de los ecosistemas naturales de la RBIM, en este caso mediante una comparación entre los resultado obtenidos en el análisis de uso del suelo que se realizó cuando se formuló el plan de manejo de la RBIM, y este período.

Para fortalecer el conocimiento medioambiental es importante compartir la experiencia en materia de gestión ambiental por medio del curso diplomado en gestión ambiental y desarrollo sostenible, con oportunidad de participación de líderes comunitarios de la zona de amortiguamiento de la reserva biológica indio maíz.

VIII. COMPARTIENDO INFORMACIÓN

CEPF tiene como objetivo compartir experiencias, lecciones aprendidas y resultados entre las organizaciones recipientes de nuestras donaciones y las comunidades de conservación y donantes más amplias. Una manera de lograr este objetivo es poniendo el texto de los informes finales de terminación de proyecto disponibles desde nuestra página Web: www.cepf.net, y incluyendo estos informes en nuestro boletín electrónico y otras comunicaciones.

Para obtener más información sobre este proyecto, favor de comunicarse con:

Nombre: Norving José Torres Cardoza
Dirección Postal: FUNDAR (de donde la Vicky de Altamira, 2c. al sur, 1c. arriba 2c. al sur.
Casa No. No.318
Tel: (505) 22709881 ò 22705434
Fax: (505) 22709881 ó 22705434
E-mail: direccion@fundar.org.ni
