

CEPF Final Project Completion Report

Instructions to grantees: please complete all fields, and respond to all questions, below.

Organization Legal Name	<i>Groupe de REcherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc (GREPOM)</i>
Project Title	The Essawira Dunes – Mapping out a sustainable future for the Coastal Atlantic Plains of Morocco
CEPF GEM No.	131 GREPOM
Date of Report	Février 2017

CEPF Hotspot: Mediterranean Basin Biodiversity Hotspot

Strategic Direction: Strategic Direction 1

Grant Amount: \$19,871

Suite au produits non délivré le montant est réduit à \$9000

Project Dates: Septembre 2014 - December 2015 (prolongé jusqu'à Octobre 2016)

1. Implementation Partners for this Project (*list each partner and explain how they were involved in the project*)

Province d'Essawira (réunion le 21 avril 2016: PV ci-joint)

La province constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale du Royaume représentant ainsi un acteur principal et facilitateur pour la mise en œuvre des activités du projet. La province a été sollicitée pour fournir la logistique nécessaire pour la réalisation des activités à savoir une salle d'exposition et un stand.

Agence Urbaine d'Essawira (réunion les 16-17 mars 2016 avec M. Daoudi, chef du Département de la Gestion Urbaine et de la Règlementation)

Cette agence est considérée comme acteur principal dans l'affectation et l'aménagement de de l'espace urbain et rural ; son intégration dans le projet a pour objet de le sensibiliser à la sauvegarde des espaces naturels, sachant que ceux-ci sont menacés surtout par l'extension urbaine et des infrastructures de transport et de tourisme. Monsieur Daoudi, après avoir partagé avec son Directeur le contenu des discussions avec GREPOM, a confirmé que l'agence est très intéressée par l'approche GIZC du projet CEPF, dans la mesure où elle l'aidera à mieux planifier l'évitement des espaces de grande valeur naturelle. Il convient de noter que les cadr'es de cette agence avaient déjà reçu une formation en développement durable, avec application au littoral d'Essawira.

Direction Provinciale des Eaux et Forêts (2 réunions de mise au point et de concertation avec M. Zouhair Amhaouch, Chef de la Division des Parcs et Réserves Naturelles à Rabat).

De par sa mission dans la conservation et l'application de la réglementation relative à la faune et à la flore sauvages et à la gestion des aires protégées, cette administration a été appelée pour orienter et faciliter l'intervention du GREPOM au niveau du littoral d'Essawira, notamment au

niveau des dunes et de l'archipel d'Essawira, qui ont une importance mondiale (Site Ramsar) et nationale (Site d'Intérêt Biologique et Ecologique).

Direction Régionale de l'Éducation Nationale (réunion de présentation du projet et échanges téléphoniques multiples pour concertation sur le mode de participation de la direction provinciale de l'éducation nationale à l'activité de sensibilisation du public scolaire).

Cet acteur est considéré comme bénéficiaire principal des produits du projet et devait accueillir l'action de sensibilisation pendant une à deux semaines, qui consistait en une exposition (et des exposés) sur le littoral du Maroc en général et d'Essawira en particulier.

Le deuxième rôle qui leur a été assigné consiste à identifier dans le plan GIZC les besoins éducatifs (en termes de visites d'illustration de l'enseignement officiel) que peut satisfaire le littoral d'Essawira. L'intégration de cet acteur constitue donc une garantie pour assurer la mise en valeur éducative (telle qu'elle fut projetée dans le plan GIZC), sachant que les associations qui pratiquent l'EAE peuvent aussi appuyer cet acteur.

La direction provinciale de l'EN d'Essawira a été concertée et sensibilisée par ladite division et a donné son accord pour accueillir l'activité de sensibilisation.

Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme d'Essawira (Communication téléphonique prolongée avec son Directeur, tenue le 23 juin).

L'intégration de cet acteur dans le projet a été proposée par l'agence urbaine, qui y a vu un acteur GIZC majeur à Essawira. Absent lors de notre passage à Essawira, le délégué du tourisme a été concerté par téléphone durant une demie heure. Après être mis au courant du projet, il a exprimé sa prédisposition à participer à tout le processus de conception et de mise en œuvre du projet GIZC. Les échanges ont permis de relever que cet acteur est déjà très engagé dans le développement du tourisme de nature dans la région et qu'il a réalisé plusieurs études. Il fut donc davantage une précieuse source d'information pour le développement du plan de gestion. L'implication de cet acteur dans la réalisation du projet est susceptible de faciliter la coordination et de drainer d'éventuels fonds et investissements pour la mise en valeur écotouristique des espaces naturels du littoral. Le GREPOM avait prévu de l'intégrer à la conception des circuits écotouristiques.

Association des Enseignants de Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) (réunion 16-17 mars 2016 avec M. Boulaanakech, Président de l'AESVT Essaouira)

Acteur local en sensibilisation des jeunes et en éducation à l'environnement, cette association aurait organisé plusieurs sorties de terrain au profit des élèves. Elle a été considérée parmi les acteurs les plus utiles à la mise en valeur éducative du littoral. Son président local a exprimé un grand enthousiasme quant à sa participation au projet dans toutes ses composantes.

GREPOM - Unité régionale de Marrakech-Haut Atlas : Concertation et participation à une visite de promotion du projet en présence d'une délégation du CEPF.

Cette unité agit au niveau du site avant tout via des experts qui assurent le suivi de l'avifaune de l'île d'Essawira, notamment du Faucon d'Éléonore. Elle est donc à la fois une source d'informations et bénéficiaire du projet ; elle était aussi considérée comme principal agent pour le pilotage et la mise en œuvre des activités projetées en sensibilisation et écotourisme.

Conservation Impacts

2. Describe how your project has contributed to the implementation of the CEPF investment strategy set out in the ecosystem profile

SD 1: Support civil society to engage stakeholders in demonstrating integrated approaches for the preservation of biodiversity in coastal areas

IP 1.1: Engage local stakeholders in conservation actions that address threats to key elements of biodiversity in priority KBAs in the coastal zone

Le plus important output attendu du projet était un plan d'action (ou de gestion) pour une utilisation durable de la zone côtière d'Essawira (plus particulièrement du complexe dunaire), où le diagnostic actualisé mis en place par le projet, y compris la carte des habitats et de l'occupation du sol (notamment l'expansion urbaine), constitue un outil de base pour cet aménagement. Ce rapport est une source d'information pour le développement d'actions de sensibilisation des différents acteurs, société civile comprise.

A chaque réunion tenue avec les parties concertées, nous avons expliqué le projet et mis l'accent sur les dysfonctionnements écologiques que subit le littoral. Différents parties prenantes ont montré un grand intérêt pour le projet et leur prédisposition à s'engager dans la gestion continue de ces écosystèmes littoraux, en particulier par la mise en valeur écotouristique et éducative.

La carte des habitats et d'occupation des sols produite lors de ce projet (voir documents joints) a été exposée dans plusieurs rencontres, elle a contribué à montrer l'ampleur de la problématique de l'urbanisation des sites côtiers entre autre celui d'Essaouira.

3. Summarize the overall results/impact of your project

- Un ensemble de réunion avec les parties prenantes et les ONG locale pour la conservation des dunes d'Essaouira selon une approche participative
- Une cartographie des habitats naturels des dunes d'Essaouira
- Le diagnostic servira de base aux partenaires pour
- Rapport sur l'état des dunes et leur statut de conservation ;
- aider les acteurs (publics et associatifs) dans le choix de l'information utile pour le guidage et la sensibilisation des visiteurs. En effet, l'information actualisée servira à améliorer le contenu du discours éducatif mené tant par les enseignants que pas les acteurs de sensibilisation et d'écotourisme.
- Les réunions d'information organisées avec les partenaires ont été focalisées sur la valeur des espaces naturels de la zone d'Essaouira et sur de nouvelles orientations de développement durable à tenir pour conserver ces espaces. L'agence urbaine a manifesté un grand intéressement au projet, de par son apport à la planification de l'occupation du territoire.

Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)

La révision de plan d'aménagement de la ville d'Essaouira, arrêter les permis de construire sur les dunes pour la conservation du SIBE

4. Actual progress toward long-term impacts at completion

Les acteurs locaux concernés sont cartographiés et sensibilisés par rapport à la conservation des dunes d'Essawira et la SIBE

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)

List each short-term impact from Grant Writer proposal

- sensibilisation des acteurs locaux sur l'importance du littoral d'Essawira et l'intérêt de le gérer selon des approches GIZC ;
- Plan d'aménagement des dunes d'Essawira révisé ;
- Plan de financement pour la mise en œuvre de plan d'aménagement révisé ;
- Analyse du statut de conservation de SIBE et les priorités écologiques.

5. Actual progress toward short-term impacts at completion

- Cartographie des parties prenantes concernées par la conservation des dunes d'Essawira. le diagnostic établi servira dans un proche avenir comme base pour l'élaboration du plan de gestion (prévu dans la 'stratégie nationale des zones humides').
- Les parties prenantes concernées par la conservation des dunes d'Essawira sont informé sur le projet et sensibilisé pour l'importance des dunes ces organisations sont essentiellement Province d'Essawira, Agence Urbaine d'Essawira, Direction Provinciale des Eaux et Forêts et Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme d'Essawira. Les organisations de la société civile ont aussi participé à cette opération.
- Malheureusement la majorité des impacts à court terme n'ont pas été atteint puisque le projet n'a pas été finalisé

6. Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impacts,

Les HCEFLCD n'a pas été sollicité pour le montage de projet et la révision de plan de gestion ce qui a causé un retard dans le démarrage des activités.

7. Were there any unexpected impacts (positive or negative)?

Le projet n'a pas été finalisé à cause des problèmes de gouvernance que l'association a traversée.

Project Components and Products/Deliverables

Component 1 (as stated in the approved proposal)

List each component and product/deliverable from Grant Writer

Composante 1 : Feuille de route pour l'utilisation durable du corridor d'Essawira adopté par les parties prenantes ((secteur privé, gouvernement et société civile).

Produit 1.1: Plan de gestion mis à jour avec les rôles et responsabilités de tous les partenaires définis et cadre de coopération approuvé et signé par tous les partenaires

- 1.1. Procéder à une analyse des parties prenantes et évaluation des capacités des principales parties prenantes, principalement les ONG.
- 1.2. Établir une plate-forme pour les discussions en cours à travers la création d'un comité mixte pour la planification de la GIZC
- 1.3. Atelier avec les parties prenantes pour examiner et mettre à jour le plan de gestion 2007 et élaborer un plan de mise en œuvre pour assurer sa réalisation

1.4. Atelier pour développer un plan de financement pour mettre en œuvre le plan révisé dans l'avenir.

8. Describe the results from Component 1 and each product/deliverable (at completion)

1.1. Procéder à une analyse des parties prenantes et évaluation des capacités des principales parties prenantes, principalement les ONG.

L'analyse des parties prenantes a été effectuée afin de choisir les acteurs pertinents qui formeront le comité mixte pour la planification en adoptant l'approche de Gestion intégrée des zones côtières à Essawira. Cette analyse a mis en évidence 12 organisations dont 9 organisations gouvernementales, 2 associations et une coopérative d'huile d'argan plus d'information dans le rapport (analyse des parties prenantes dune Essaouira) les rapports est certainement pas complété et mérite d'être amélioré dans un deuxième temps mais ça nous a permis de faire une idée sur les organisations concernées par la conservation des dunes d'Essaouira. Ce travail a permis à l'association d'établir une relation de confiance avec ces parties prenantes. Les organisations concernées sont les suivants :

- ✓ Départements Ministériels directement concernés par les activités du projet

Délégation Provinciale de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Délégation Provinciale du Ministère du Tourisme d'Essaouira
Direction Provinciale des Eaux et Forêts
Agence Urbaine d'Essaouira (Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire)
Province (Ministère de l'Intérieur)
Délégation des pêches maritimes d'Essaouira, Département de la pêche maritime (Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime)
Office National des Pêches (ONP)
Conseil Provincial du Tourisme d'Essaouira

- ✓ Collectivités territoriales

Conseil Provincial
Conseil Communal

- ✓ Institutions non-gouvernementales

GREPOM / BirdLife Maroc (Unité Régionale Haut Atlas - Marrakech)
Association des Enseignant de Sciences de la Vie et de la Terre
Argania Culture et Développement

1.2. Établir une plate-forme pour les discussions en cours à travers la création d'un comité mixte pour la planification de la GIZC

Toutes les parties prenantes concernées ont été sensibilisées et ont exprimé leur volonté à participer dans la plate-forme néanmoins à cause de certaines problèmes interne à l'association cette plateforme n'a pas été créé dans les délais.

1.3. Atelier avec les parties prenantes pour examiner et mettre à jour le plan de gestion 2007 et élaborer un plan de mise en œuvre pour assurer sa réalisation

La mise à jour de plan de gestion 2007 n'a pas eu lieu.

Problème de gouvernance : l'ancien bureau exécutif n'a pas lancé les activités à temps. Leur départ et le temps pris pour recruter un nouveau staff ont fait que ces activités n'ont pas pu être réalisées.

1.4. Atelier pour développer un plan de financement pour mettre en œuvre le plan révisé dans l'avenir.

L'activité 1.4. est liée à l'activité 1.3 et par conséquent cette activité n'a pas eu lieu également

Component 2 (as stated in the approved proposal)

Statut de Conservation des Dunes mieux compris et promu

Produit 2.1: Rapport sur le statut de conservation des dunes et habitats associés

2.1. Actualiser les informations sur le SIBE sur la base de nouvelles données (faune et menaces).

2.2. Analyser l'état de conservation et la distribution des habitats écologiques prioritaires par le travail sur le terrain avec des ONG locales et le gouvernement.

9. Describe the results from Component 2 and each product/deliverable (at completion)

2.1. Actualiser les informations sur le SIBE sur la base de nouvelles données (faune et menaces).


Une étude bibliographique a été effectuée en se basant sur des études et plan de gestion anciens nous a permis de préparer un rapport préliminaire sur le statut de conservation de SIBE d'Essaouira et l'expansion de la ville. C'est un rapport qui présente le patrimoine écologique et paysager du territoire, les menaces auxquelles il est exposé et les actions et recommandations de développement durable en mesure de le sauvegarder.

Fondée en 1764, la ville d'Essaouira, qui allait devenir rapidement un des ports importants du Maroc à l'époque, était entourée du côté terrestre par une forêt dense de genévriers rouges. La construction de la ville, puis son extension en 1809 combinée au développement de ses activités portuaires ont résulté de très importants déboisement qui ont été à l'origine d'une déstabilisation totale du milieu : disparition totale de la forêt de genévrier rouge sur un rayon de 8 à 15 km autour de la ville et formation d'un vaste champ dunaire qui évoluait à l'intérieur des terres et gagnait les terrains de culture et la forêt de thuya situées à la périphérie de l'ancienne junipéraie à cause des vents violents et fréquents.

Devant la gravité et l'ampleur de ce problème d'ensablement, les dunes ont été "fixées" mécaniquement et biologiquement à partir de 1918 et en plusieurs étapes afin d'assurer la protection de la ville et de ses liaisons routières avec Safi et Marrakech. Achèvement en 1986, ces travaux de fixation dont les actions de maintenance et de densification se poursuivent toujours, ont permis outre l'acquisition d'une expérience en matière de fixation des dunes côtières et la maîtrise de cette technique, la protection de la ville et ses infrastructures, la mise en valeur des dunes (production de bois et création d'emplois), et leur inscription au répertoire des sites d'intérêt biologique et écologique (SIBE) et à l'inventaire Ramsar de zones humides.

Les dunes d'Essaouira, qui font partie du patrimoine mondiale suite à leur inscription, avec l'archipel, à la liste Ramsar de zones humides, inventoriées en tant que Site d'Intérêt Biologique

et Ecologique (SIBE) dans le Plan Directeur des Aires Protégées du Maroc, constituent une grande valeur esthétique, et une grande richesse écologique floristique et faunistique qui requiert une gestion raisonnée et durable et des actions de valorisation. Une carte résumant l'occupation de l'espace a été produite en se basant sur des données satellitaires et une visite complémentaire sur terrain :

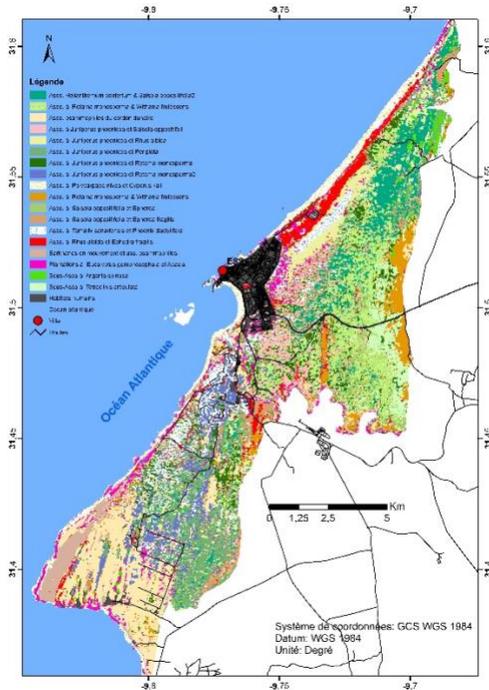

Carte des habitats naturels d'Essaouira

Les dunes d'Essaouira renferment un nombre important de taxons endémique. Parmi les 634 espèces de plantes spontanées recensées dans le SIBE, plus de 58 taxons sont endémiques. La SIBE contient également une richesse faunistique considérable avec 21 espèce de reptile, 235 espèces d'oiseaux, 15 espèces de mammifères.

A l'échelle internationale les dunes d'Essaouira sont classées avec les zones humides comme site Ramsar et SIBE. Le statut de conservation des dunes d'Essaouira à l'échelle nationale n'est pas favorable pour la protection des dunes d'Essaouira contre l'expansion de la ville et la mise en place de nouveau lotissement de construction. En outre il est intéressant de mentionner que les dunes sont protégées par les lois suivant :

- ✓ Loi n° 81-12 relative au littoral : établit les principes et les règles fondamentaux d'une gestion intégrée durable du littoral en vue de sa protection, de mise en valeur et de sa conservation.
- ✓ Loi 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement
- ✓ La loi n° 07- 22 relative aux aires protégées
- ✓ Loi 22-80 relative à la conservation du patrimoine culturel et historique : définit et régit les explorations, découvertes, conservation du patrimoine

Le rapport résume un ensemble de recommandation pour améliorer le statut de conservation des dunes d'Essaouira (Annexe.2. rapport sur le statut de conservation des dunes et habitats)

Composante 3 (as stated in the approved proposal): Soutien de la population locale à la protection des Dunes d'Essaouira et des corridors voisins augmenté

Produit 3.1: Leaflets distributed to government departments, hotels, community and schools trips to dunes carried out

3.1. Organiser un atelier avec les ONG locales et les agences de tourisme locales pour accroître la sensibilisation et la communication sur les corridors écologiques, éco touristiques et environnementaux et l'utilité de développer des projets d'écotourisme dans la région.

3.2. Produire des flyers pour faire connaître le potentiel de la région et de les distribuer aux ONG locales, les agences et les agences touristiques.

3.3. Organiser un événement pour la découverte des dunes pour 80 écoliers avec la participation des superviseurs représentant 1 à 2 ONG locales.

Composante 3 (at completion)

3.1. Organiser un atelier avec les ONG locales et les agences de tourisme locales pour accroître la sensibilisation et la communication sur les corridors écologiques, éco touristiques et environnementaux et l'utilité de développer des projets d'écotourisme dans la région.

L'atelier n'a pas eu lieu à cause de plusieurs contraintes. Cependant une série de réunion a été effectuée, ayant pour objectif la planification des évènements de sensibilisation, ont permis de définir un scénario d'organisation qui implique principalement la Direction provinciale de l'Education Nationale et l'agence de tourisme.

3.2. Produire des flyers pour faire connaître le potentiel de la région et de les distribuer aux ONG locales, les agences et les agences touristiques.

On a produit des posters sous le thème '*Littoral du Maroc*' au lieu des flyers

- **Exposition '*Littoral du Maroc*'** (Voir annexe I) : conçue comme outil de valorisation éducative et écotouristique du corridor, elle constitue la base pour l'organisation de l'*événement de sensibilisation*. Cet évènement était prévu à l'occasion de la COP22, mais l'exposition est conçue parmi plusieurs expositions itinérantes qui sont présentées dans les régions où le GREPOM a une représentation.

Un groupe de conception et d'organisation de cette exposition a été constitué dans le cadre de ce projet et a tenu plusieurs réunions, dont deux ont concerné tout le groupe et d'autres se sont déroulées en sous-groupes thématiques restreints. Ces réunions ont permis la définition des thématique et des formats de l'exposition et de désigner les responsables de la conception et de la réalisation de l'exposition (Voir Annexe II).

Une centaine de photographies (en possession des membres du GREPOM) ont été sélectionnées et au moins 20 posters ont été préparés, mais la réalisation de cette exposition a été interrompue à la réception de l'information de la fermeture du projet par BirdLife. La réalisation sera poursuivie début 2017, à l'aide d'un autre budget mobilisé par le GREPOM.

3.3. Organiser un événement pour la découverte des dunes pour 80 écoliers avec la participation des superviseurs représentants 1 à 2 ONG locales.

Cet événement n'a pas été organisé, mais il y a eu une visite accompagnée par les membres du CEPF et auquel ont assisté de nombreux partenaires locaux associatifs et gouvernementaux. (21

10. If you did not complete any component or deliverable, how did this affect the overall impact of the project?

Le plan de gestion/action a été à moitié préparé (limité au diagnostic actualisé), sachant que les actions de gestion n'ont pas été rédigées, sachant que sa validation a été considérée comme relevant des attributions du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification. Néanmoins, même si ces actions auraient été préparées, leur implémentation n'aurait pas pu être réalisée vu que les textes d'application de la Loi sur les Aires Protégées n'ont toujours pas été adoptés.

Concernant l'évènement de sensibilisation, sa réalisation était prévue lors de la COP22, événement où l'afflux touristique vers Essawira était important ; c'est dire qu'un grand effectif de visiteurs aurait été touché par l'évènement. Toutefois, le GREPOM a décidé de poursuivre ses efforts pour achever l'exposition, où il a déjà investi beaucoup ; nous estimons qu'elle compensera le retard de réalisation dudit évènement.

11. Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or contributed to the results

Les résultats/produits soumis ci-joint à ce rapport sont :

- Doc 1_ Rapport sur le status de conservation des dunes et habitats - Essaouira;
- Doc 2 _Cartographie des habitats et de l'occupation des sols pour le plan GIZC ;
- Doc 3_Rapport d'analyse des parties prenantes au projet (concertées à propos du plan GIZC et de l'évènement de sensibilisation) ;
- Doc 4_Annexes :Compte-rendu de réunion avec les responsables de la Province d'Essawira en annexe ; Plan de conception de l'exposition '*Littoral du Maroc*' en annexe ;
- Doc 5_Exposition_dunes essaouira_Posters : Copies de projets de posters réalisés pour l'exposition, en préparation de l'évènement de sensibilisation.

Benefits to Communities

12. Please describe the communities that have benefited from CEPF support

Please report on the size and characteristics of communities and the benefits that they have received, as a result of CEPF investment. Please provide information for all communities that have benefited **from project start to project completion**.

Community Name	Community Characteristics							Nature of Socioeconomic Benefit												
	Subsistence economy	Small landowners	Indigenous/ ethnic peoples	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants	Urban communities	Other*	Size of Community				Increased access to clean water	Increased food security	Increased access to energy	Increased access to public services (e.g. health care, education)	Increased resilience to climate change	Improved land tenure	Improved recognition of traditional knowledge	Improved representation and decision-making in governance forums/structures	Improved access to ecosystem services
								50-250 people	251-500 people	501-1,000 people	Over 1,001 people									
Acteurs actifs en éducation à l'environnement						*		*												*

*If you marked "Other" to describe the community characteristic, please explain:

Lessons Learned

13. Describe any lessons learned related to organizational development and capacity building.

14. Describe any lessons learned related to project Design Process (*aspects of the project design that contributed to its success/shortcomings*)

La nécessité d'avoir l'accord de principe écrit des partenaires est la principale leçon tirée de cette expérience. Cette leçon a permis d'ancrer de nouvelles règles de gouvernance dans le GREPOM.

15. Describe any lesson learned related to project Implementation (*aspects of the project execution that contributed to its success/shortcomings*)

Pour faire réussir des projets comportant des activités de terrain, il faut disposer d'un staff stable.

16. Describe any other lessons learned relevant to the conservation community

Sustainability / Replication

17. Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated

Plusieurs facteurs ont ralenti l'exécution du projet :

- Procédure de concertation lourde, en raison de la multiplicité des concernés et de la faible réactivité de l'autorité compétente.
- Instabilité du staff de l'association (changement radical du mode de gouvernance de l'association avec son affiliation à BirdLife).

18. Summarize any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability

Safeguards

19. If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation of any required action related to social and environmental safeguards that your project may have triggered

Additional Funding

20. Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the project, organization, or the region, as a result of CEPF investment

Donor	Type of Funding*	Amount	Notes

* Categorize the type of funding as:

- A Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this project)
- B Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
- C Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF investment or successes related to this project)

Additional Comments/Recommendations

21. Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or CEPF

Le projet a été proposé sans concertation, ni avec le bureau administrative du projet, ni avec les concernés locaux et nationaux.

Un effort respectable a été fourni par le nouveau staff du Groupe de Recherche pour la Protection des Oiseaux au Maroc pour réussir le projet, mais la surcharge de travail et le mauvais départ pris par ce projet (depuis sa conception), ont ralenti la réalisation des activités.

Vu que le GREPOM a développé des attentes à Essawira et n'entend pas abandonner son projet d'exposition Littoral du Maroc, pour laquelle il a déjà investi beaucoup. Il a donc déployé un budget provenant d'un autre projet financé par une compagnie privée spécialisée en énergies renouvelables. Malgré la fermeture du projet, le logo du CEPF sera utilisé dans l'exposition.

Information Sharing and CEPF Policy

CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences, lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site, www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.

Please include your full contact details below:

22. Name: Dr. Khadija Bourass

23. Organization GREPOM/BirdLife Maroc

24. Mailing address: Institut Scientifique, Avenue Ibn Battouta, B.P. 703, 10106 Agdal , Rabat, Maroc

25. Telephone number: +2126 13633387

26. E-mail address: bourass_khadija@yahoo.fr
